

INFO-PROJET

Modernisation de la Centrale Isle-Maligne | 2025 à 2032

Mars 2026



Progrès général
17%

Nombre d'heures travaillées
541 000

Nombre de travailleurs
160

300 emplois directs et indirects durant les travaux



Bon coup

Le 6 février dernier, le projet a remis un montant de **3 337 \$** à chacun des deux organismes, soit le **Centre l'Escale et le Renfort**, dans le cadre du programme *Arrêtez et demandez de l'aide 2025*.

Complété en 2025

- Relocalisation du **poste de distribution 26kv**
- Réhabilitation du **plancher** au niveau des alternateurs

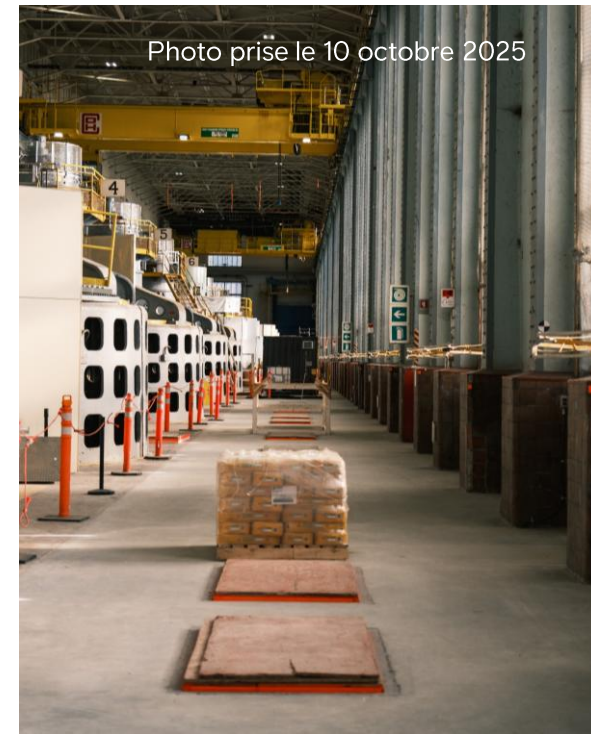


Photo prise le 10 octobre 2025

INFO-PROJET

Modernisation de la Centrale Isle-Maligne | 2025 à 2032

Mars 2026



Le remplacement du **groupe turbine-alternateur (GTA) #6** est en cours.

- C'est le premier des huit GTA à être remplacé dans le cadre du projet. Le croisillon supérieur, le stator, le rotor sont démantelés.
- Le prochain sera le GTA #11 dont le démantèlement commencera à l'automne 2026.

L'installation des **caissons** permettant de mettre à sec la **prise d'eau** et le **passage hydraulique** au GTA #6 est complétée.

- Leur réhabilitation est en cours.

Les travaux des **vannes papillons** du GTA #11 sont presque terminés et leur mise en service est prévue pour la crue printanière.

- Pour le GTA #6, les travaux sont complétés à 90 %.
- Le remplacement des vannes papillons est officiellement terminé pour 10 autres groupes.



Photo prise le 24 février 2026



Photo prise le 18 septembre 2025

INFO-PROJET

Modernisation de la Centrale Isle-Maligne | 2025 à 2032

Mars 2026



La protection du jeu de barres existant de **13,8 kV** est complétée aux planchers mezzanine et des transformateurs.

- L'infrastructure principale de chemin de câble est également installée au plancher mezzanine.

La démolition du mur et les travaux de fondations en vue de l'**agrandissement de la centrale** sont en cours.

- La charpente d'acier débutera en avril.

L'installation du plancher temporaire pour la **réhabilitation de la toiture** au niveau des alternateurs est complétée.

- La réhabilitation s'amorcera ce printemps.

L'installation des ancrages en vue du **remplacement des deux vannes à l'évacuateur 4** pour l'opération hivernale est en cours.

- La mobilisation de l'entrepreneur pour le remplacement aura lieu au printemps.



Photo prise le 24 février 2026



Photo prise le 20 janvier 2026
